

11月

# 土佐山小中学校統合整備工事 現場だより




日足がめっきり短くなりました。  
皆様にはますますご隆昌の事と存じます。

## いよいよ土佐山小中学校統合整備工事が着工いたしました。



運動場の遊具の解体から始まり、順次杭工事を行っていきます。  
大型車両等の通行があり、また騒音等でご迷惑をおかけしますが、なにとぞ工事へのご協力をお願いいたします。

小学校南側の掲示板に工事の予定表などを掲載していますのでご覧ください

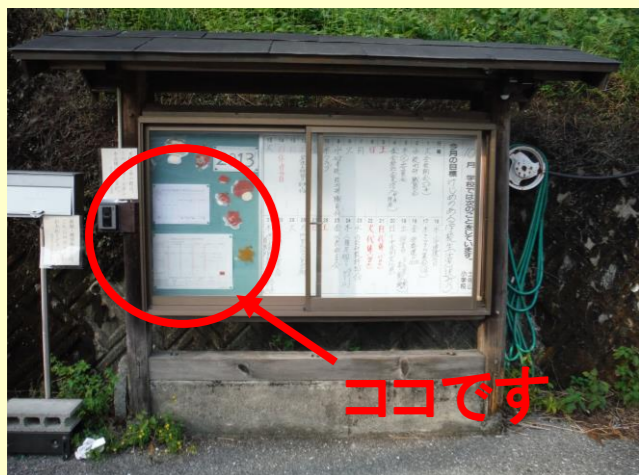

## カブトムシ?の幼虫発見!!




運動場の西あたりで樹木を撤去したらカブトムシと思われる幼虫がたくさん出てきました。何匹かは小学校で飼われているようです。



## ～工事紹介～ 地業工事(杭打ち)

建造物を安全に支えるため、基礎の下に杭を打ちます。

オールケーシング工法  
ハンマーグラフという機械で土を掘り出し、そのできた穴の中に柱状に組んだ鉄筋を入れ、コンクリートを流し込みます。  
出した土をダンプで搬出し、コンクリートをミキサー車で搬入します。  
約1ヶ月かけて、深さ10m前後のコンクリートの杭を30本打ちます。

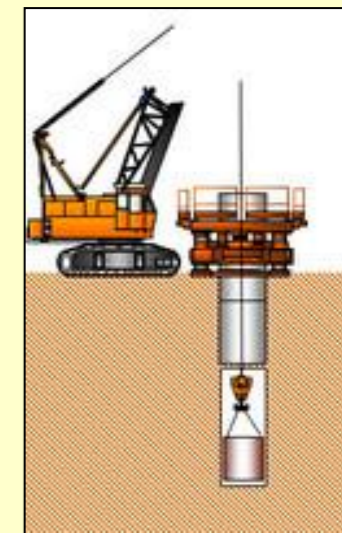

## 現場監督紹介

無事、工事の完成を目指して頑張っています。



作業所所長 今井 桂三  
主任技術者 大山 泰弘 現場代理人 井上 祥也



### 連絡先

新進・鎌倉特定建設工事共同企業体  
TEL 088-850-6511  
FAX 088-850-6512  
携帯電話  
TEL 080-6282-0086
